



oggetto intervento:

# MUSEO NAZIONALE DI CASTEL SANT'ANGELO E PASSETTO DI BORGO

Ubicazione: Lungotevere Castello n. 50, 00193 Roma

Codice Intervento:

Tipologia Opere: RESTAURO

Progetto: DEFINITIVO

## INTERVENTO DI RESTAURO DELLE SUPERFICI MURARIE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FINITURE

firme soggetti responsabili:

	Committente:	DIREZIONE MUSEI STATALI DELLA CITTÀ DI ROMA
	Responsabile unico del procedimento:	dott.ssa MARIATELLA MARGOZZI
Coordinamento alla progettazione architettonica:		arch. ANTONIO ZUNNO
	Ufficio di Direzione lavori:	ing. ELENA ANNA BOLDETTI
		dott.ssa LUISA CAPAROSSI
		arch. MICHELA CATALANO
		dott.ssa SILVANA COSTA
		dott.ssa CHIARA DELPINO
		arch. GABRIELLA MUSTO
		arch. VALENTINA OLIVERIO
		arch. ANTONIO ZUNNO
Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:		ing. LUCA LENZI
	Assistenza al R.U.P.:	arch. MARCO BERTI
		arch. CLAUDIA VULLO

titolo elaborato:

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - DIAGRAMMA DI GANTT

n° tavola

9.5

Codice Elaborato

Ufficio competente

Codice Edificio/Strada

Tip.Prog.

Tip.Doc.

ID Doc.

Progr.

Rev.

Scala







revisione elaborato


0	Febbraio 2023					
N° Rev.	Data Rev.	Descrizione Revisione	Visto	Firma	Redazione grafica	

ID	Testo1	Testo2	Moda attivi	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Pre	Semestre 1, 2024					
									S	O	N	D	G	F
1	Accantieramento	Accantieramento		Accantieramento generale	5 giorni	lun 04/09/23	ven 08/09/23							
2	Facciata Sud	Accantieramento		Accantieramento Facciata Sud	3 giorni	lun 11/09/23	mer 13/09/23	1						
3	Facciata Sud	Accantieramento		Accantieramento Facciata Sud – Fase A	2 giorni	lun 11/09/23	mar 12/09/23	1						
4	Facciata Sud	Lavorazioni		Lavorazioni Pavimentazione Facciata Sud – Fase A	35 giorni	mer 13/09/23	mar 31/10/23	3						
5	Facciata Sud	Lavorazioni		Disaccantieramento Facciata Sud – Fase A	1 giorno	mer 01/11/23	mer 01/11/23	4						
6	Facciata Sud	Accantieramento		Accantieramento Facciata Sud – Fase B	1 giorno	gio 02/11/23	gio 02/11/23	5						
7	Facciata Sud	Lavorazioni		Lavorazioni Pavimentazione Facciata Sud – Fase B	35 giorni	ven 03/11/23	gio 21/12/23	6						
8	Bastione San Matteo	Accantieramento		Accantieramento Bastione San Matteo	5 giorni	ven 22/12/23	gio 28/12/23	7						
9	Bastione San Matteo	Ponteggio		Allestimento Ponteggio Bastione San Matteo	15 giorni	ven 29/12/23	gio 18/01/24	8						
10	Bastione San Matteo	Ponteggio		Realizzazione Scala comoda Bastione San Matteo	4 giorni	ven 19/01/24	mer 24/01/24	9						
11	Bastione San Matteo	Ponteggio		Installazione reti Bastione San Matteo	5 giorni	gio 25/01/24	mer 31/01/24	10						
12	Bastione San Matteo	Lavorazioni		Lavorazioni Bastione San Matteo	105 giorni	gio 01/02/24	mer 26/06/24	11						
13	Bastione San Matteo	Ponteggio		Rimozione Ponteggio Bastione San Matteo	15 giorni	gio 27/06/24	mer 17/07/24	12						
14	Bastione San Matteo	Disaccantieramento		Disaccantieramento Bastione San Matteo	5 giorni	gio 18/07/24	mer 24/07/24	13						
15	Bastione San Giovanni	Accantieramento		Accantieramento Bastione San Giovanni	5 giorni	gio 01/02/24	mer 07/02/24	11						
16	Bastione San Giovanni	Ponteggio		Allestimento Ponteggio Bastione San Giovanni	15 giorni	gio 08/02/24	mer 28/02/24	15						
17	Bastione San Giovanni	Ponteggio		Realizzazione Scala comoda Bastione San Giovanni	5 giorni	gio 29/02/24	mer 06/03/24	16						
18	Bastione San Giovanni	Ponteggio		Installazione reti Bastione San Giovanni	3 giorni	gio 07/03/24	lun 11/03/24	17						
19	Bastione San Giovanni	Lavorazioni		Lavorazioni Bastione San Giovanni	105 giorni	mar 12/03/24	lun 05/08/24	18						
20	Bastione San Giovanni	Ponteggio		Rimozione Ponteggio Bastione San Giovanni	15 giorni	mar 06/08/24	lun 26/08/24	19						
21	Bastione San Giovanni	Disaccantieramento		Disaccantieramento Bastione San Giovanni	5 giorni	mar 27/08/24	lun 02/09/24	20						
22	Controfacciata Sud	Accantieramento		Accantieramento Controfacciata Sud	5 giorni	mar 12/03/24	lun 18/03/24	18						
23	Controfacciata Sud	Ponteggio		Allestimento Ponteggio Controfacciata Sud	15 giorni	mar 19/03/24	lun 08/04/24	22						
24	Controfacciata Sud	Ponteggio		Installazione reti Controfacciata Sud	4 giorni	mar 09/04/24	ven 12/04/24	23						
25	Controfacciata Sud	Lavorazioni		Lavorazioni Controfacciata Sud	65 giorni	lun 15/04/24	ven 12/07/24	24						
26	Controfacciata Sud	Ponteggio		Rimozione Ponteggio Controfacciata Sud	20 giorni	lun 15/07/24	ven 09/08/24	25						
27	Controfacciata Sud	Disaccantieramento		Disaccantieramento Controfacciata Sud	5 giorni	lun 12/08/24	ven 16/08/24	26						
28	Facciata Sud	Ponteggio		Allestimento Ponteggio Facciata Sud	15 giorni	lun 15/04/24	ven 03/05/24	24						
29	Facciata Sud	Ponteggio		Allestimento Ponteggio Facciata Sud – telo pubblicitario	5 giorni	lun 06/05/24	ven 10/05/24	28						
30	Facciata Sud	Ponteggio		Realizzazione Scala comoda Facciata Sud	4 giorni	lun 13/05/24	gio 16/05/24	29						
31	Facciata Sud	Ponteggio		Installazione reti Facciata Sud	5 giorni	ven 17/05/24	gio 23/05/24	30						
32	Facciata Sud	Lavorazioni		Lavorazioni Facciata Sud	230 giorni	ven 24/05/24	gio 10/04/25	31						


Elaborato: 9.5	Attività		Riepilogo progetto		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Scadenza	
	Divisione		Attività esterne		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Avanzamento	
	Cardine		Cardine esterno		Attività manuale		Solo inizio		Avanzamento manuale	
	Riepilogo		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine			

ID	Testo1	Testo2	Moda attivi	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Pre	Semestre 1, 2024					
									S	O	N	D	G	F
33	Facciata Sud	Ponteggio		Rimozione ponteggio Facciata Sud	20 giorni	ven 11/04/25	gio 08/05/25	32						
34	Facciata Sud	Disaccantieramento		Disaccantieramento Facciata Sud	5 giorni	ven 09/05/25	gio 15/05/25	33						
35	Camminamenti	Accantieramento		Accantieramento Camminamenti	5 giorni	ven 24/05/24	gio 30/05/24	31						
36	Camminamenti	Ponteggio		Installazione reti Camminamenti	5 giorni	ven 31/05/24	gio 06/06/24	35						
37	Camminamenti	Lavorazioni		Lavorazioni Camminamenti con installazione di piattaforme per calate e relativo accantieramento della zona oggetto d'intervento	130 giorni	ven 07/06/24	gio 05/12/24	36						
38	Camminamenti	Ponteggio		Rimozione reti Camminamenti	5 giorni	ven 06/12/24	gio 12/12/24	37						
39	Camminamenti	Disaccantieramento		Disaccantieramento Camminamenti	5 giorni	ven 13/12/24	gio 19/12/24	38						
40	Cordonata Paolo III	Accantieramento		Accantieramento Cordonata Paolo III	5 giorni	ven 24/05/24	gio 30/05/24	31						
41	Cordonata Paolo III	Ponteggio		Allestimento Ponteggio Cordonata Paolo III	5 giorni	ven 31/05/24	gio 06/06/24	40						
42	Cordonata Paolo III	Ponteggio		Installazione reti Cordonata Paolo III	5 giorni	ven 07/06/24	gio 13/06/24	41						
43	Cordonata Paolo III	Lavorazioni		Lavorazioni Cordonata Paolo III	120 giorni	ven 14/06/24	gio 28/11/24	42						
44	Cordonata Paolo III	Ponteggio		Rimozione Ponteggio Cordonata Paolo III	5 giorni	ven 29/11/24	gio 05/12/24	43						
45	Cordonata Paolo III	Disaccantieramento		Disaccantieramento Cordonata Paolo III	5 giorni	ven 06/12/24	gio 12/12/24	44						
46	Corpo di Guardia	Accantieramento		Accantieramento Corpo di Guardia	5 giorni	ven 14/06/24	gio 20/06/24	42						
47	Corpo di Guardia	Ponteggio		Allestimento Ponteggio Corpo di Guardia	10 giorni	ven 21/06/24	gio 04/07/24	46						
48	Corpo di Guardia	Ponteggio		Installazione reti Corpo di Guardia	5 giorni	ven 05/07/24	gio 11/07/24	47						
49	Corpo di Guardia	Lavorazioni		Lavorazioni Corpo di Guardia	120 giorni	ven 12/07/24	gio 26/12/24	48						
50	Corpo di Guardia	Ponteggio		Rimozione Ponteggio Corpo di Guardia	10 giorni	ven 27/12/24	gio 09/01/25	49						
51	Corpo di Guardia	Disaccantieramento		Disaccantieramento Corpo di Guardia	5 giorni	ven 10/01/25	gio 16/01/25	50						
52	Biglietteria	Accantieramento		Accantieramento Biglietteria	5 giorni	ven 17/01/25	gio 23/01/25	51						
53	Biglietteria	Ponteggio		Allestimento Ponteggio Biglietteria	5 giorni	ven 24/01/25	gio 30/01/25	52						
54	Biglietteria	Ponteggio		Installazione reti Biglietteria	5 giorni	ven 31/01/25	gio 06/02/25	53						
55	Biglietteria	Lavorazioni		Lavorazioni Biglietteria	15 giorni	ven 07/02/25	gio 27/02/25	54						
56	Biglietteria	Ponteggio		Rimozione Ponteggio Biglietteria	5 giorni	ven 28/02/25	gio 06/03/25	55						
57	Biglietteria	Disaccantieramento		Disaccantieramento Biglietteria	5 giorni	ven 07/03/25	gio 13/03/25	56						
58	Disaccantieramento	Disaccantieramento		Disaccantieramento generale	10 giorni	ven 16/05/25	gio 29/05/25	34						

Elaborato: 9.5	Attività		Riepilogo progetto		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Scadenza	
	Divisione		Attività esterne		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Avanzamento	
	Cardine		Cardine esterno		Attività manuale		Solo inizio		Avanzamento manuale	
	Riepilogo		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine			

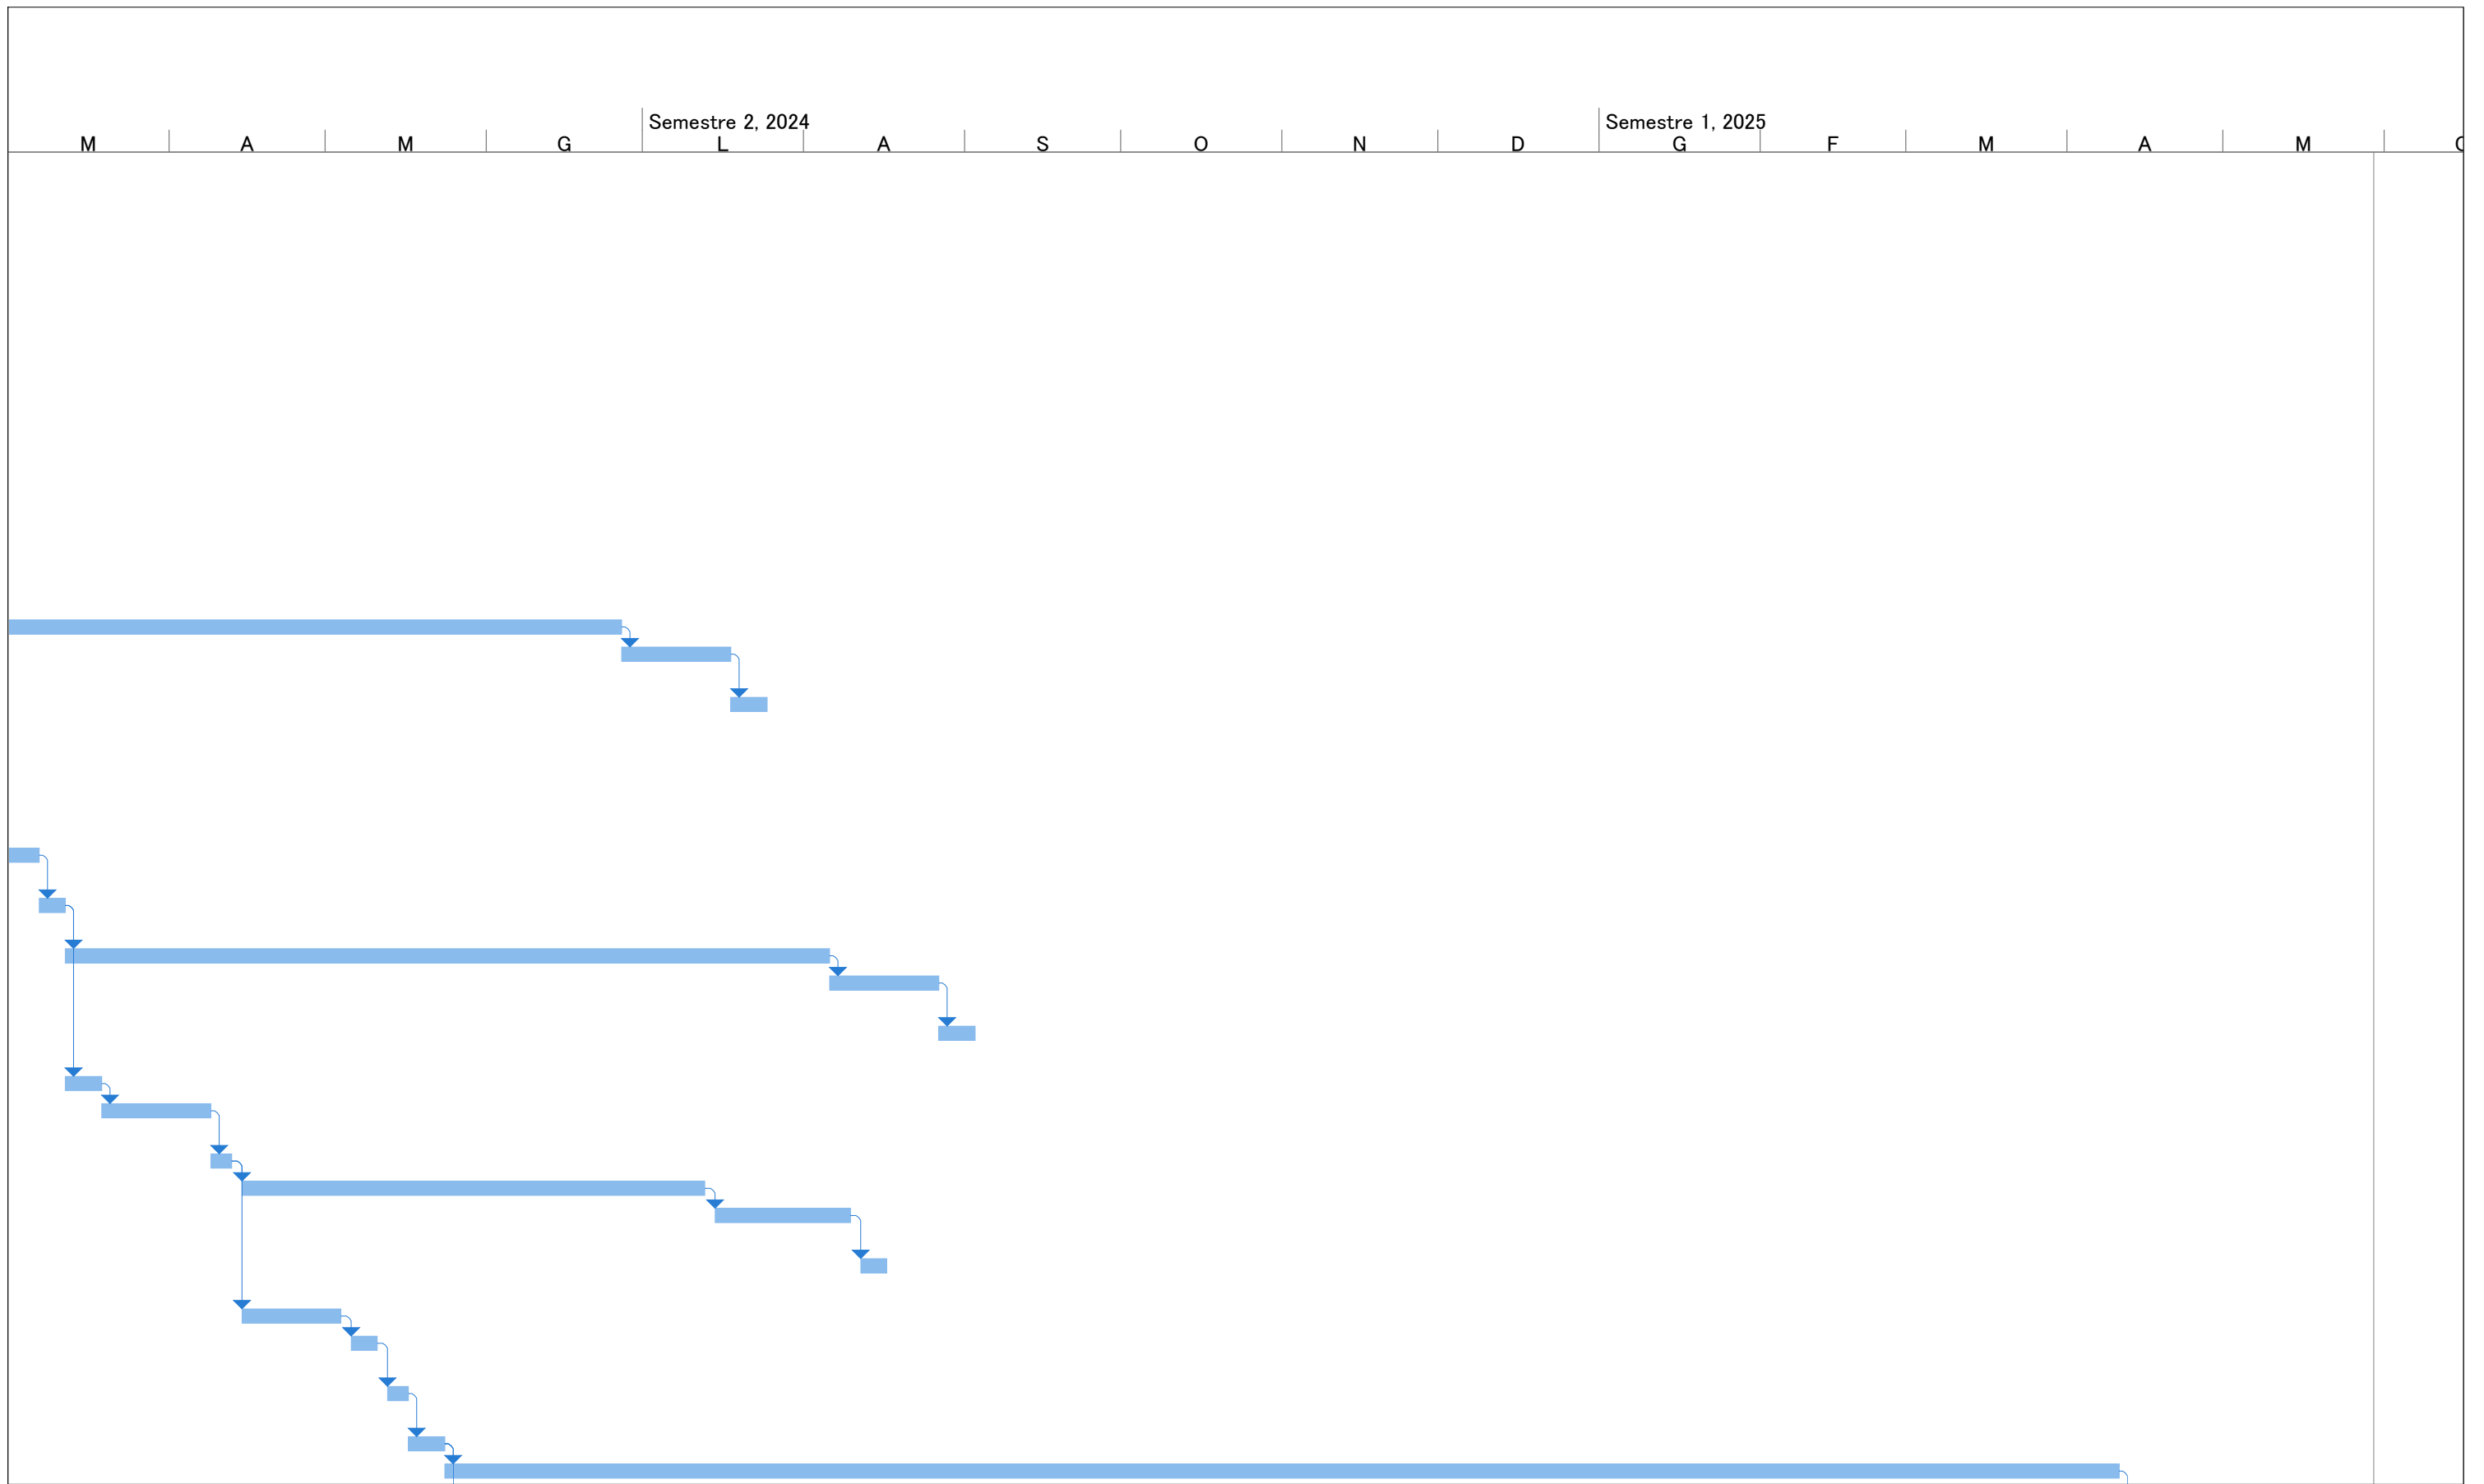

Elaborato: 9.5	Attività		Riepilogo progetto		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Scadenza	
	Divisione		Attività esterne		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Avanzamento	
	Cardine		Cardine esterno		Attività manuale		Solo inizio		Avanzamento manuale	
	Riepilogo		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine			

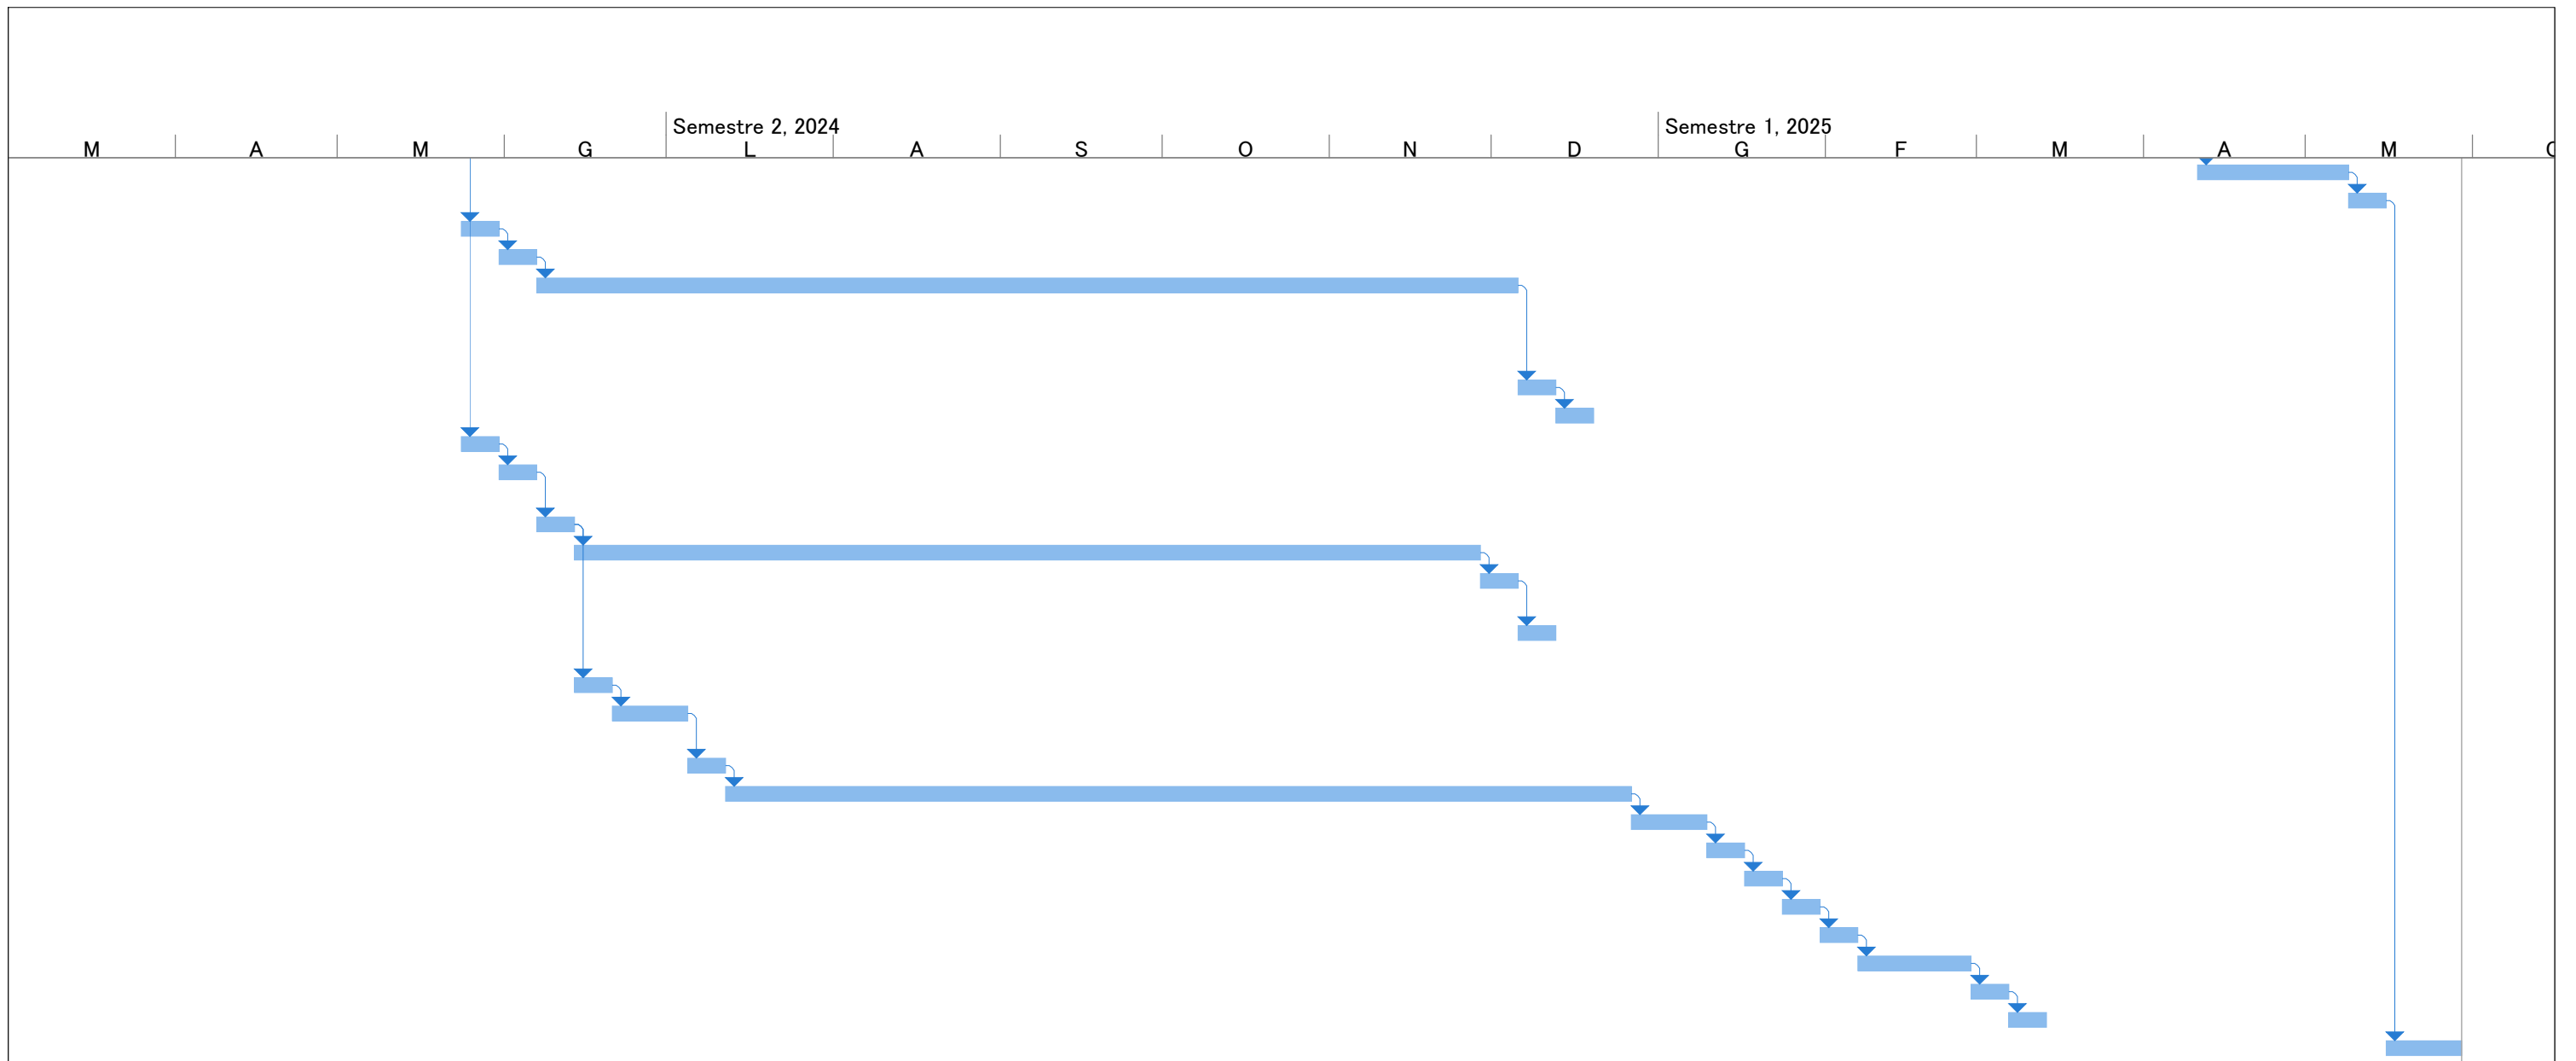

Elaborato: 9.5	Attività		Riepilogo progetto		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Scadenza	
	Divisione		Attività esterne		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Avanzamento	
	Cardine		Cardine esterno		Attività manuale		Solo inizio		Avanzamento manuale	
	Riepilogo		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine			
